

**Willkommen zur
Informationsveranstaltung
Sanierung Möschbergweg**

Besprechungspunkte

1. Vorstellung Sanierungsprojekt
2. Erläuterung Projekt ENGH
3. Bauphasenplan gemeinsam anschauen
4. Nächste Schritte 2025
5. Kommunikation und Ansprechpersonen
6. Fragen, Anliegen und Wünsche seitens Grundeigentümer:innen
7. Verschiedenes

Punkt 1

Vorstellung Sanierungsprojekt

Punkt 2

Erläuterung Projekt ENGH

Punkt 3

Bauphasenplan



Etappe 1 & 2
Ab 06.10. bis
16.12.2025

Etappe 3 & 4
Ab 12.01. bis
16.03.2026



Bauetappe 1 & 2

Bauphase / Etappe 1	49 Tage	Don 09.10.25
Etappensignalisation	1 Tag	Don 09.10.25
Etappeninstallation	1 Tag	Don 09.10.25
Abbrucharbeiten Belag, Besteinung, etc.	2 Tage	Fre 10.10.25
Arbeiten an Abwasser-, Meteorwasserleitung inkl. Schächte, Rückfüllung, Spriessung	7 Tage	Die 14.10.25
Werkleitungsarbeiten	7 Tage	Mit 22.10.25
Fundationsschicht / Rohplanie	2 Tage	Don 30.10.25
Besteinungsarbeiten	3 Tage	Mon 03.11.25
Feinplanie	1 Tag	Don 06.11.25
Tragschichteinbau mit Etappe 2	1 Tag	Die 16.12.25
Bauphase / Etappe 2	28 Tage	Fre 07.11.25
Etappensignalisation	1 Tag	Fre 07.11.25
Etappeninstallation	1 Tag	Fre 07.11.25
Abbrucharbeiten Belag, Besteinung, Böschungsmauer, etc.	4 Tage	Mon 10.11.25
Arbeiten an Abwasser-, Meteorwasserleitung inkl. Schächte, Rückfüllung, Spriessung	7 Tage	Don 13.11.25
Neue Böschungsmauer erstellen, Teilaushübe, Schalung, Bewehrung, Betonierarbeiten	9 Tage	Fre 21.11.25
Werkleitungsarbeiten	8 Tage	Fre 28.11.25
Fundationsschicht / Rohplanie	2 Tage	Die 09.12.25
Besteinungsarbeiten	2 Tage	Don 11.12.25
Feinplanie	1 Tag	Mon 15.12.25
Tragschichteinbau	1 Tag	Die 16.12.25

Punkt 4

Nächste Schritte 2025

Punkt 5

Kommunikation und Ansprechpartner


Ansprechperson

Stämpfli AG Bauunternehmung	Roman Stalder (Geschäftsführer und Bauführer) 079 729 24 13
Projektingenieur	Jürg Kaufmann 031 839 84 40
Gemeinde Oberthal	Lena Gerber 031 710 26 26
Energie Grosshöchstetten	Thorsten Simon 076 282 52 70

Neuigkeiten auf der Homepage

www.oberthal.ch

Aktuell
Bauarbeiten Möschberg

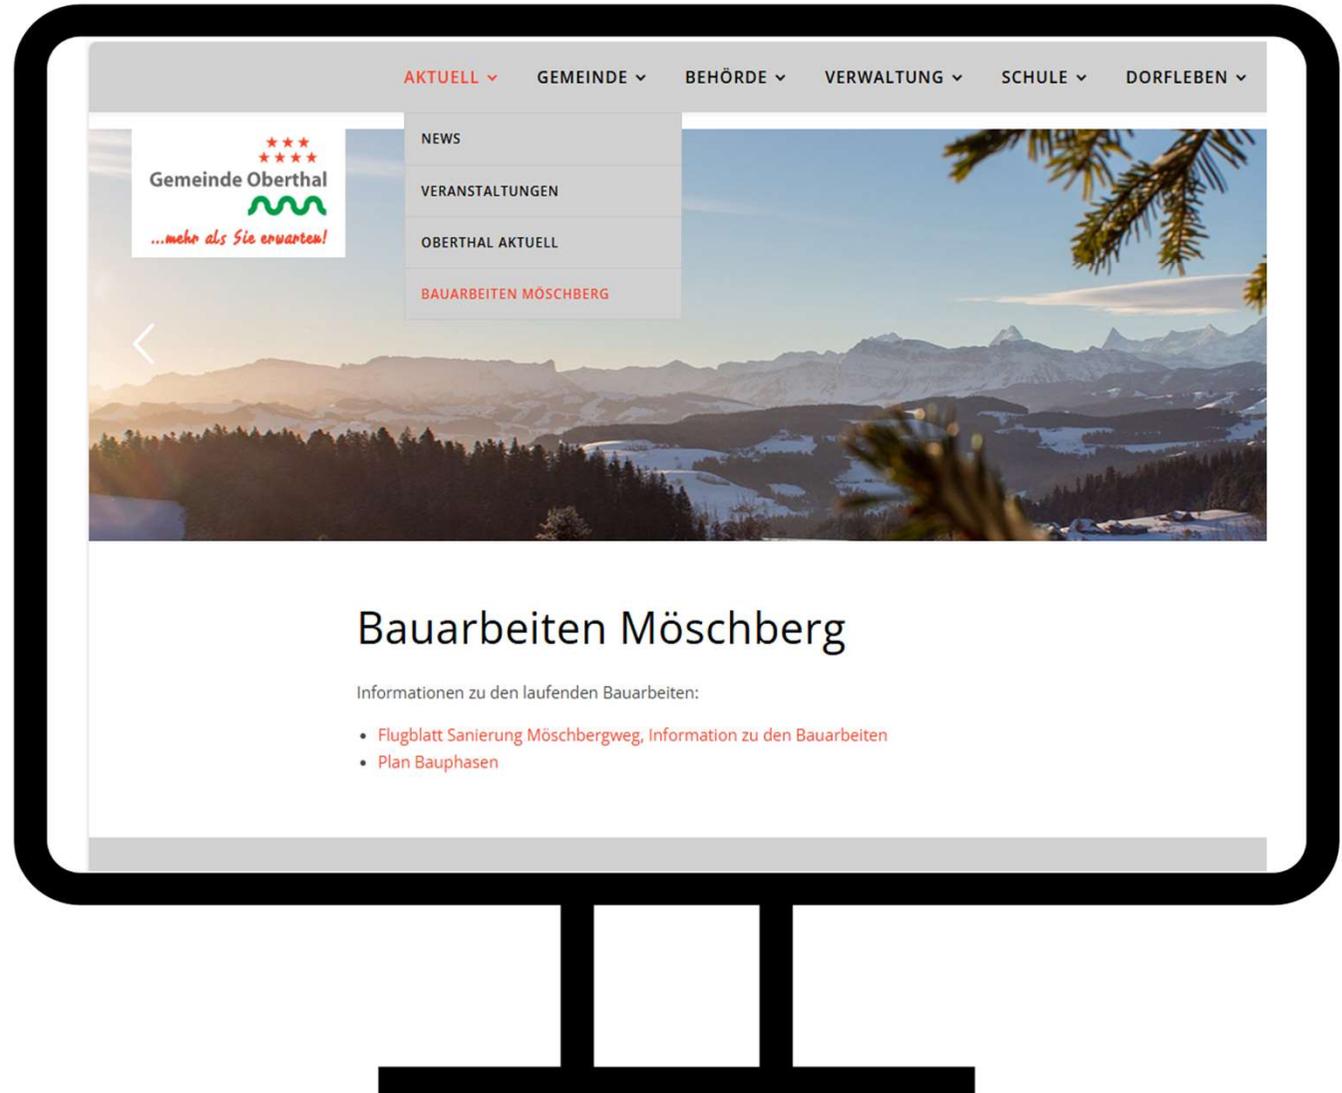

Punkt 6

**Fragen, Anliegen und Wünsche
seitens Grundeigentümer:innen**

Punkt 7

Verschiedenes

Kehrrichtentsorgung

Veränderung für Einwohner:innen von Grosshöchstetten:

Hauskehrricht

ab Freitag, 12. Oktober – Ende Etappe 6: Abfuhrtag am
Montag (anstatt Freitag)


Grüngut

Keine Veränderung der Sammeltage.



Terminvereinbarung Einzelbeurteilung

- mit Florian Buol, Geobau Ingenieure AG, für Aufnahme Rissprotokoll
- mit Jürg Kaufmann und Vertretung Stämpfli Bauunternehmung AG



**Vielen Dank für Ihre Teilnahme -
wir wünschen einen schönen
Abend!**



To-Do vor Veranstaltung

- Einrichten Beamer und Stühle
- PP ausdrucken für Notizen (in Broschüren Format A4)
- Beamer (inkl. langes HDMI-Kabel)
- Laptop Gemeinde (für Protokoll login via webinterface)
- Laptop Lena für PP (inkl. Stromkabel und HDMI Kabel)
- Zettel für Angabe Kontaktdaten und Terminfindung?

To-Do nach Versammlung (Nachbearbeitung)

- Aktennotiz schreiben
- Homepage aktualisieren mit Unterlagen
